



CGPISF

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

18/07/2018


PAUTA

- a) Abertura
- b) Aprovação da Transcrição *ipsis verbis* da 8ª reunião ordinária do CGPISF
- c) Informes:
 - a) Andamento das Obras
 - b) Emissão da Licença de Operação
 - c) Cessão provisória dos bens do PISF à Operadora Federal
 - d) Liberação de águas do Pisf durante pré-operação
- d) Estudo de Viabilidade de Energias Alternativas para o Pisf
- e) Plano de Gestão Anual 2018 e 2019

ANDAMENTO DAS OBRAS

EIXO NORTE – Meta 1N

- 30/04/2018: Rescisão com o Consórcio EMSA/SITON
- 03/05/2018: Contratação da Ferreira Guedes
- Entrou com ritmo adequado de mobilização
- Atacando pontos chaves para o caminho das águas: EBI-3 e Túnel Milagres

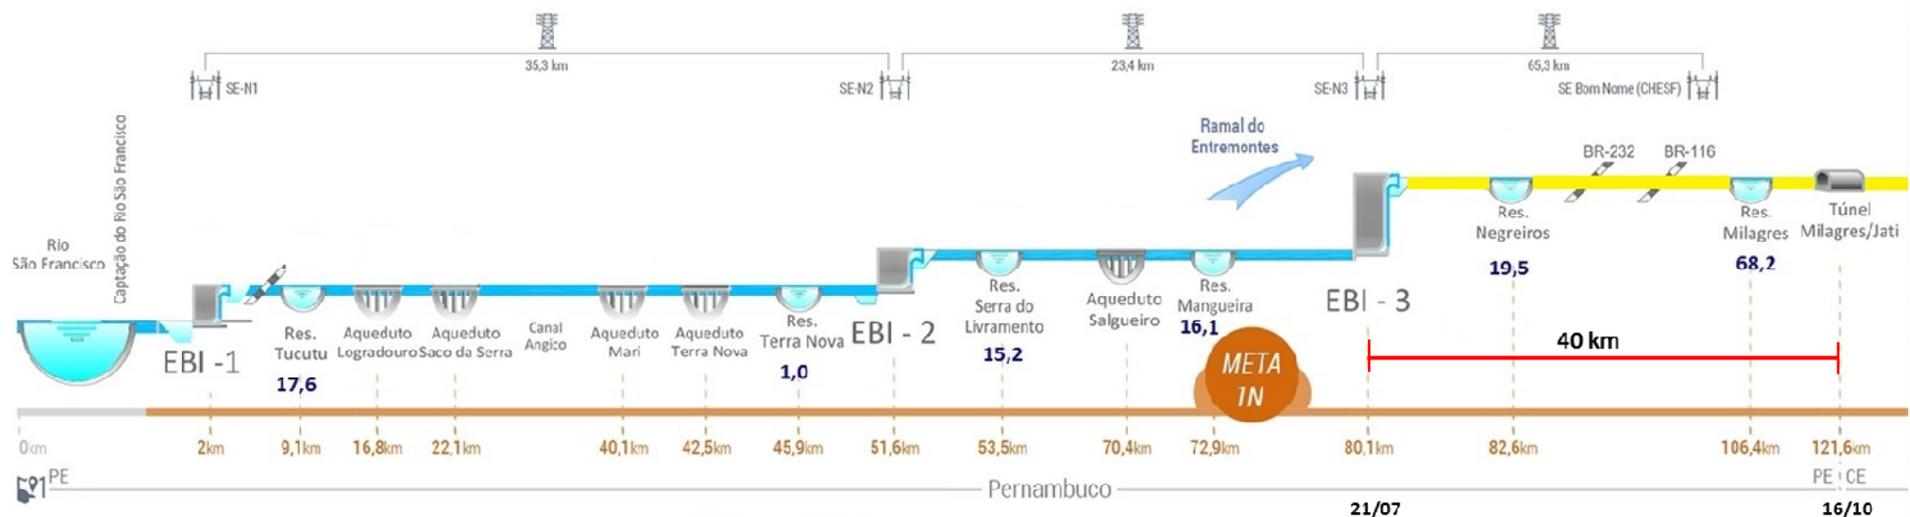

21/07

16/10

PE CE

EIXO NORTE

- Outubro – água atravessa fronteira do CE
- 2 meses para enchimento do reservatório Jati
- Prazo para chegar a Morros e Boa Vista (entrega no Rio Piranhas) depende:
 - da quantidade de água que será entregue no CAC e
 - do funcionamento de mais um conjunto motobomba (reforço SE N3 em fase de licitação)
 - Quantidade de água armazenada nos reservatórios

EIXO NORTE

Canal Caiçara-Ávidos:

- Solicitação de LI em análise há 2 anos pelo IBAMA – MI solicitou agilidade

Ramal do Apodi:

- MI terá que solicitar LI
- Desapropriações:
 - MI elaborará projeto de deslocamento de pessoas
 - Necessários R\$ 30mi, dos quais temos R\$ 5mi
 - Bancadas CE e RN podem remanejar o restante (R\$ 25mi) na próxima janela orçamentária
 - SIH/MI autorizou início da fase interna de licitação
 - Fase externa depende do OGU 2019 (limite já estabelecido no PAC)

EIXO LESTE

ABR/18 - Interrompido bombeamento no Eixo Leste para:

- Obras nas tomadas d'água de Poções e Camalaú
- Ajustes em estruturas do Pisf:
 - Aqueduto Jacaré – conclusão em 31/7/18
 - Reservatório Barreiros – intervenção concluída
 - Reservatório Cacimba Nova – recuperação iniciada, porém não impede passagem de água

AGO/18 – Retomada do bombeamento no Eixo Leste:

- Entrega somente da vazão necessária para Adutora do Congo (+/- 500l/s)

AGO/18 – Instalação da parte lógica dos medidores de vazão/nível

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Licenciamento Ambiental

2005: Obtenção da Licença Prévia (LP-200/2005)

2007: Obtenção da Licença de Instalação (LP nº 438/2007)

2013: Renovação da Licença de Instalação (LI nº 925/2013)

2016: Solicitação da Licença de Operação

- Jul/2016 - Solicitação da LO conjunta
- Dez/2016 - Requerimento da Licença de Operação por Eixo

2018: Previsão de obtenção da LO

- Fev/18: IBAMA aprovou o Estudo de Análise de Riscos (EAR) e solicitou adequações no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Plano de Ações Emergenciais (PAE), com o objetivo de torná-los mais executivos
- Jul/18: Enviadas adequações solicitadas pelo IBAMA

Licenciamento Ambiental

Saneamento das cidades ao longo dos canais e nas bacias receptoras:

- MP orientou que o MI não libere água nos leitos que estiverem recebendo esgoto ou resíduos sólidos
- Cidades em alerta:
 - PB (Norte): Monte Horebe, São José de Piranhas
 - PB (Leste): Monteiro
 - CE (Norte): Jardim, Jati

CESSÃO PROVISÓRIA DE BENS À OPERADORA FEDERAL

Cessão provisória dos bens do PISF à OF


- Iniciadas as vistorias conjuntas MI / Codevasf com vistas à assunção da Codevasf
- Em elaboração documentos para cessão provisória:
 - Termo de cessão provisória: conforme orientação SPU
 - Matriz de responsabilidades


LIBERAÇÃO DE ÁGUAS DO PISF EM FASE DE PRÉ-OPERAÇÃO

Liberação de água do PISF

- Nota Técnica nº 05/2018/CGAOH/DPE/SIH-MI, com **MAPA DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE ÁGUA DURANTE A PRÉ-OPERAÇÃO DO PISF**
- Diretrizes com vistas a:
 - Tornar o processo mais objetivo;
 - Gerenciar a expectativa de recebimento das águas do PISF pelas populações beneficiadas;
 - Cumprir as determinações do arcabouço institucional do PISF; e
 - Permitir tomada de decisão adequada.

MAPA DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE ÁGUA DURANTE A PRÉ-OPERAÇÃO DO PISF:

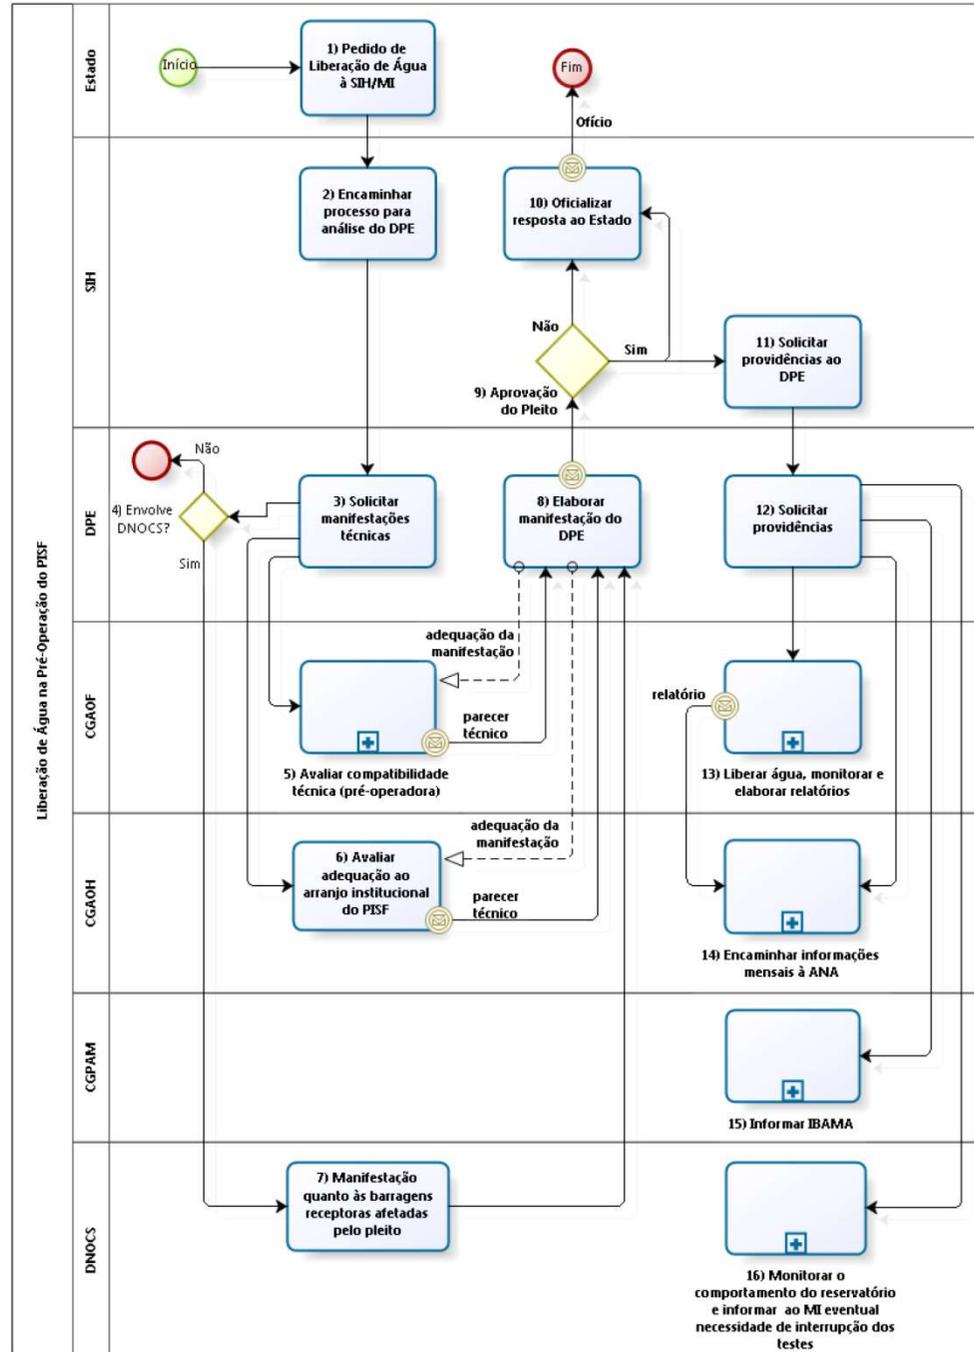

 Ministério da
Integração Nacional

