




# PROJETO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TERRA NA BACIA DO SÃO FRANCISCO ANA/GEF/PNUMA/OEA

## Subprojeto 4.7 D – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Projeto de Recursos Hídricos

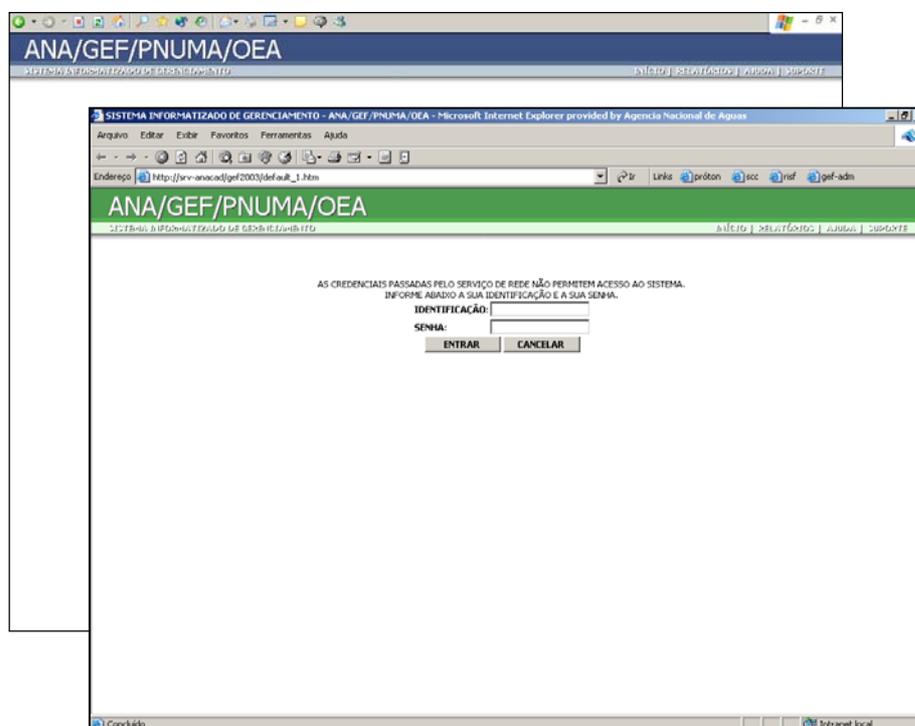

## Relatório Final

# DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF



**PROJETO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DAS  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TERRA  
NA BACIA DO SÃO FRANCISCO  
ANA/GEF/PNUMA/OEA**

**Subprojeto 4.7 D – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Projeto de  
Recursos Hídricos**

**Relatório Final**

**DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  
DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF**

**Coordenação do Subprojeto**  
José Luiz de Souza  
Coordenação Técnica do GEF São Francisco

**Consultor**  
  
IKHON GESTÃO, TECNOLOGIA E CONHECIMENTOS

**Maio de 2003**

# **DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF**

## **RESUMO EXECUTIVO**

### **INTRODUÇÃO**

O Subprojeto 4.7 D – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Projetos de Recursos Hídricos desenvolvido no âmbito do Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA) é parte do Componente IV – Formulação do Programa de Gerenciamento Integrado/Plano de Ações Específicas da Bacia e sua zona costeira. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução informatizada de controle de Projeto e otimização do gerenciamento físico e financeiro.

Com o objetivo de gerenciar todo o processo de estabelecimento desta política faz-se necessário que a Coordenação do projeto tenha acesso às informações do trabalho de toda a equipe, de forma ágil e integrada e em tempo real. Para suprir esta necessidade foi desenvolvido o Sistema Informatizado de Gerenciamento, ferramenta eletrônica que controla todas as atividades do projeto, desde o planejamento até a execução financeira, facilitando assim a gerência do projeto e o acompanhamento de todas as suas ações.

O presente sistema desenvolvido para os Projetos GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto Paraguai, pode também ser utilizado por qualquer outro, como o GEF Aquífero Guarani, etc.

O presente relatório compõe-se de quatro capítulos apresentados a seguir de forma sucinta. O capítulo 1 apresenta os antecedentes e objetivos do Sistema Informatizado de Gerenciamento. No capítulo 2 encontra-se a caracterização do sistema desenvolvido, apresentando brevemente linguagem utilizada e modelo de dados. No capítulo 3 são apresentadas as principais telas componentes do Sistema. No capítulo 4 são apresentadas as conclusões e recomendações extraídas das atividades desenvolvidas.

### **1. ANTECEDENTES E OBJETIVOS**

Até o desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais todos os procedimentos administrativos e controle do projeto eram realizados em planilhas e documentos eletrônicos. O processo apresentava falho, apesar de todo o controle realizado na Coordenação do projeto e Direção Nacional. A falta de um repositório único para todas as informações, e o acesso restrito as mesmas comprometiam a consistência e o controle das atividades.

Para contornar estas dificuldades, as seguintes atividades foram propostas:

- Desenvolver e implementar 02 (dois) Sistemas Informatizados de Gerenciamento, um para cada Projeto (GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto Paraguai), baseando-se nas atividades desenvolvidas na Coordenação do projeto e Direção Nacional, e segundo as orientações estabelecidas no Guia Operativo;
- Treinar os usuários que irão utilizar o Sistema Informatizado de Gerenciamento;
- Promover a migração e entrada dos dados das fontes de informação existentes.

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

O Sistema de Informações Gerenciais foi desenvolvido para funcionar na estrutura de informática da Agência Nacional de Águas. Como um dos objetivos do Sistema é o seu acesso de qualquer ponto do país, foi definida a padronização de Internet para o seu desenvolvimento. Em função da estrutura de informática existente e da padronização de Internet foi escolhida a tecnologia Microsoft ASP para o desenvolvimento do Sistema, utilizando o banco de dados Microsoft SQL Server 2000 como repositório de dados.

A estrutura do sistema está dividida em módulos: planejamento, execução e administração.

## 3. TELAS DO SISTEMA

### 3.1. Telas do Sistema GEF São Francisco

As principais telas do sistema são apresentadas no presente relatório.



**Figura1. Tela de Entrada do Sistema de Informações Gerenciais do Projeto GEF São Francisco**

### 3.2. Telas Sistema GEF Pantanal/Alto Paraguai

A semelhança do GEF São Francisco, também são apresentadas as principais telas desenvolvidas para o Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai.



**Figura 2. Tela de Entrada do Sistema de Informações Gerenciais do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai**

#### **4. CONCLUSÕES**

O sistema foi desenvolvido em sintonia com assessoria administrativa/financeira dos dois projetos GEF, primeiros usuários do sistema. Desta forma, houve um acompanhamento *pari-passo* durante o desenvolvimento do sistema.

A maior parte das informações existentes em outras fontes de dados já está inserida no banco de dados do Sistema, sendo que o restante das informações dos Projetos GEF Pantanal/Alto Paraguai e GEF São Francisco encontram em processo de lançamento nos respectivos sistemas. A implantação dos Sistemas de Informações Gerenciais promoveu a melhoria dos procedimentos gerenciais dos Projetos, contribuindo para o acompanhamento, controle e eficiência de suas ações.

#### **5. RECOMENDAÇÕES**

Nota-se que para o desenvolvimento das atividades deste Subprojeto, consolidadas no Sistema em conteúdo foram consumidos recursos preciosos de diversas fontes. Sendo assim, recomenda-se:

- Que a experiência acumulada, os produtos desenvolvidos, manuais de procedimentos, documentação técnica, e outros produtos deste Subprojeto sejam reutilizados em outras atividades do Projeto GEF, e mesmo em outros projetos que possuam estrutura semelhante, sob o comando da Organização dos Estados Americanos – OEA;
- Que as atividades do Subprojeto sejam continuadas, visando um melhor aproveitamento das ações já realizadas, e a melhoria do Sistema Informatizado de Gerenciamento, uma vez que o mesmo pode ser utilizado em todos os Projetos GEF que possuam estrutura semelhante aos Projetos GEF Pantanal/Alto Paraguai e São Francisco;
- Que se realizem procedimentos de manutenção continuada e evolutiva, visando um constante aprimoramento do Sistema de Informações Gerenciais de cada Projeto.

# DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	3
<b>1. ANTECEDENTES E OBJETIVOS</b>	4
<b>2. ASPECTOS TÉCNICOS</b>	4
<b>3. TELAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO</b>	5
3.1. Telas do Sistema GEF São Francisco	5
3.2. Telas do Sistema GEF Pantanal/Alto Paraguai	15
<b>4. CONCLUSÕES</b>	25
<b>5. RECOMENDAÇÕES</b>	25
<b>6. BIBLIOGRAFIA</b>	26
<b>7. ATORES</b>	26

## ANEXOS

### 1. MODELO DE DADOS

### LISTA DE FIGURAS

1. Tela de Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF São Francisco
2. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF São Francisco, mostrando as funções e o extrato do Projeto.
3. Tela de controle do Projeto GEF São Francisco
4. Tela de controle de Componentes do Projeto GEF São Francisco
5. Tela de controle de Subprojetos do Projeto GEF São Francisco
6. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado do Projeto GEF São Francisco
7. Tela de controle de Solicitações de Pagamento do Projeto GEF São Francisco
8. Tela de controle de Solicitações de Suprimento de Fundos do Projeto GEF São Francisco
9. Tela de controle de Solicitações de Viagem do Projeto GEF São Francisco
10. Tela de controle de Solicitação de Recursos do Projeto GEF São Francisco
11. Tela de inclusão de Solicitações do Projeto GEF São Francisco
12. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado do Projeto GEF São Francisco
13. Impressão da Solicitação de Pagamento do Projeto GEF São Francisco
14. Impressão da Solicitação de Viagem do Projeto GEF São Francisco
15. Tela Controle de Consultores do Projeto GEF São Francisco
16. Tela de controle de Empresas do Projeto GEF São Francisco
17. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual do Projeto GEF São Francisco
18. Tela de controle de Rubricas do Projeto GEF São Francisco
19. Tela do Repositório de Documentação do Projeto do Projeto GEF São Francisco
20. Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai

21. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, mostrando as funções e o extrato do Projeto.
22. Tela de controle do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
23. Tela de controle de Componentes do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
24. Tela de controle de Subprojetos do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
25. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai.
26. Tela de controle de Solicitações de Pagamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
27. Tela de controle de Solicitações de Suprimento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
28. Tela de controle de Solicitações de Viagem do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
29. Tela de controle de Solicitação de Recursos do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
30. Tela de inclusão de Solicitações do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
31. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
32. Impressão da Solicitação de Pagamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
33. Impressão da Solicitação de Viagem do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
34. Tela Controle de Consultores do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
35. Tela de controle de Empresas do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
36. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
37. Tela de controle de Rubricas do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai
38. Tela do Repositório de Documentação do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai

# **DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS PROJETOS GEF**

## **INTRODUÇÃO**

O Subprojeto 4.7 D – Sistema Informatizado de Gerenciamento de Projetos de Recursos Hídricos desenvolvido no âmbito do Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA) é parte do Componente IV – Formulação do Programa de Gerenciamento Integrado/Plano de Ações Específicas da Bacia e sua zona costeira. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução informatizada de controle de Projeto e otimização do gerenciamento físico e financeiro.

A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco representa uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, abrangendo 639.219 km<sup>2</sup> de área de drenagem, correspondendo a 7,55% do país. Está dividida em 4 regiões fisiográficas: Alto São Francisco; Médio São Francisco; Sub-médio São Francisco e Baixo São Francisco. Cerca de 16,14 milhões de pessoas (9,5% da população do país) habitam a Bacia Hidrográfica do São Francisco, sendo que maior densidade demográfica encontra-se concentrada no Alto e Médio São Francisco (80%) de toda sua população.

Existem alguns conflitos no que tange a interesses da gestão, aproveitamento e restrições do uso dos recursos hídricos, além de conflitos entre demandas para usos consultivos e qualidade inadequada das águas.

A Bacia apresenta alguns desafios principais, dentre os quais os de definir uma estratégia que solucione conflitos entre os diversos usuários, conflitos entre a demanda para usos consultivos e insuficiência de água, além da implementação de sistemas de saneamento básico (Industrial e Doméstico), dentre outros. Dentre as estratégias para solucionar conflitos entre os diversos usuários da água e o gerenciamento dos recursos hídricos, a informação e a participação da sociedade surgem como instrumentos que conduzem a sociedade a integrar o processo decisório com vistas a uso sustentável dos recursos hídricos.

Com o objetivo de gerenciar todo o processo de estabelecimento desta política faz-se necessário que a Coordenação do projeto tenha acesso às informações do trabalho de toda a equipe, de forma ágil e integrada e em tempo real. Para suprir esta necessidade foi desenvolvido o Sistema Informatizado de Gerenciamento, ferramenta eletrônica que controla todas as atividades do projeto, desde o planejamento até a execução financeira, facilitando assim a gerência do projeto e o acompanhamento de todas as suas ações.

O presente sistema desenvolvido para os Projetos GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto Paraguai, pode também ser utilizado por qualquer outro, como o GEF Aquífero Guarani, etc.

O presente relatório compõe-se de 4 (quatro) capítulos apresentados a seguir de forma sucinta. O capítulo 1 apresenta os antecedentes e objetivos do Sistema Informatizado de Gerenciamento. No capítulo 2 encontra-se a caracterização do sistema desenvolvido, apresentando brevemente linguagem utilizada e modelo de dados. No capítulo 3 são apresentadas as principais telas componentes do Sistema. No capítulo 4 são apresentadas as conclusões e recomendações extraídas das atividades desenvolvidas.

## **1. ANTECEDENTES E OBJETIVOS**

Até o desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais todos os procedimentos administrativos e controle do projeto eram realizados em planilhas e documentos eletrônicos. O processo apresentava falho, apesar de todo o controle realizado na Coordenação do projeto e Direção Nacional. A falta de um repositório único para todas as informações, e o acesso restrito as mesmas comprometiam a consistência e o controle das atividades.

Para contornar estas dificuldades, as seguintes atividades foram propostas:

- Desenvolver e implementar 02(dois) Sistemas Informatizados de Gerenciamento, um para cada Projeto (GEF São Francisco e GEF Pantanal/Alto Paraguai), baseando-se nas atividades desenvolvidas na Coordenação do projeto e Direção Nacional, e segundo as orientações estabelecidas no Guia Operativo;
- Treinar os usuários que irão utilizar o Sistema Informatizado de Gerenciamento;
- Promover a migração e entrada dos dados das fontes de informação existentes.

O Sistema possui ainda as seguintes características:

- Atender a todos os participantes do Projeto;
- Ser totalmente informatizado e com funcionamento via INTERNET;
- Ser descentralizado e distribuído de tal forma que os dados sejam coletados nas respectivas fontes, junto a cada usuário;
- Conter informações de controle, monitoria, avaliação, andamento físico e financeiro, normas, decisões e comunicações, dentre outras de interesse das instituições responsáveis pela supervisão e controle do Projeto.

## **2. ASPECTOS TÉCNICOS**

O Sistema de Informações Gerenciais foi desenvolvido para funcionar na estrutura de informática da Agência Nacional de Águas. Como um dos objetivos do Sistema é o seu acesso de qualquer ponto do país, foi definida a padronização de Internet para o seu desenvolvimento. Em função da estrutura de informática existente e da padronização de Internet foi escolhida a tecnologia Microsoft ASP para o desenvolvimento do Sistema, utilizando o banco de dados Microsoft SQL Server 2000 como repositório de dados. O modelo de dados do Sistema esta no Anexo 1.

A estrutura do Sistema foi dividida em:

- Planejamento

Controle de todas as informações contidas no Plano de Operações, devidamente detalhadas, para permitir a administração do Projeto nos níveis desejados, informações relevantes que forem sendo estabelecidas em cada Subprojeto, principalmente os indicadores de desempenho. Da mesma forma, o Sistema possui flexibilidade para permitir alterações nas ações e atividades planejadas, ao longo de seu desenvolvimento;

- Execução

Controle de todas as informações sobre o andamento físico e financeiro das atividades e ações programadas.

- Administração


Controle das informações geradas por todos os participantes do Projeto, facilitando as comunicações, as determinações de gerenciamento e a monitoria/avaliação dos Projetos, em todos os níveis.

Para a utilização do Sistema é necessário que o usuário possua um navegador de Internet (Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer), e uma conexão com o servidor do Sistema, que no momento da entrega deste relatório encontrava-se no seguinte endereço: <http://www.ana.gov.br/gef2003>. Nenhuma instalação se faz necessária. A versão que o usuário estiver utilizando é sempre a última versão disponível do Sistema.

### 3. TELAS DO SISTEMA

#### 3.1. Telas do Sistema GEF São Francisco

Para demonstrar alguns aspectos do Sistema Informações Gerenciais do Projeto GEF São Francisco são apresentadas as principais telas.

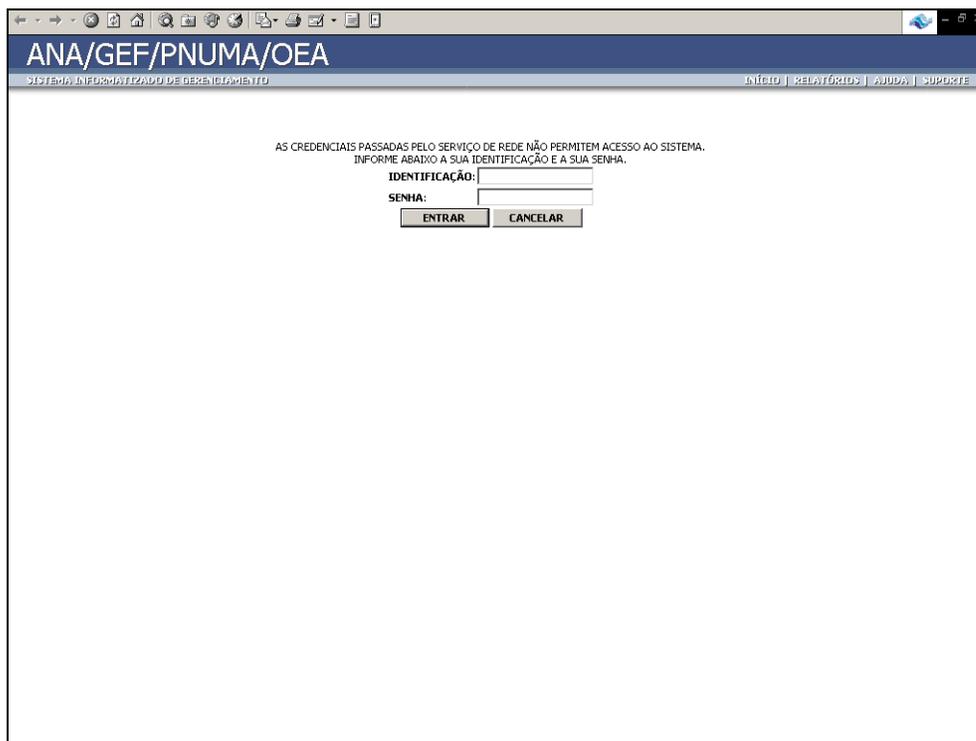

**Figura 1. Tela de Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF São Francisco**

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**PROJETO SÃO FRANCISCO**

O PROJETO GEF SÃO FRANCISCO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E DE SUA ZONA COSTEIRA, COM BASE NA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ABORDAGEM DE GERENCIAMENTO INTEGRADO ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS.

**PLANEJAMENTO ANUAL**

ANO	VALOR PREVISTO:	VALOR ALOCADO EM CPR:	VALOR PAGO/UTILIZADO:	SALDO EM ALOCAÇÃO:	SALDO FINANCEIRO:
2003	US\$ 879.901,00	US\$ 721.880,02	US\$ 31.600,00	US\$ 158.020,98	US\$ 848.301,00

**SUBPROJETOS**

SUBPROJETO	RECURSOS PREVISTOS
0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	US\$ 286.019,57
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE	US\$ 170.714,00
1.1 B - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE	US\$ 48.590,00
1.1 C - ESTUDO DA AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA NAVEGAÇÃO DO RSF NO ALIMENTO DA COMPETITIVIDADE DA AGRICULTURA NA BACIA	US\$ 7.500,00
1.2 - IMPACTO DA MINERAÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS NO ALTO RIO DAS VELHAS (MG)	US\$ 15.800,00
1.3 - RECOMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA REOFÍLICA DO BAIXO SÃO FRANCISCO	US\$ 47.570,00
1.4 - DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BAIXO SÃO FRANCISCO	US\$ 158.055,00
1.5 - IMPACTO DA AGRICULTURA NOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS NO RIO VERDE/JACARÉ (BA)	US\$ 88.940,00
2.1 - DETERMINAÇÃO DO USO DA TERRA NO BAIXO SÃO FRANCISCO (AL/SE)	US\$ 18.837,50
2.2 A - PARCERIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO SÃO PEDRO (MG)	US\$ 65.346,10
2.2 B - RECUPERANDO NOSSAS MATAS (MG)	US\$ 50.930,00
2.2 C - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS DA CALHA DO SÃO FRANCISCO	US\$ 88.525,00
2.3 - ESTABILIZAÇÃO VEGETATIVA DAS MARGENS DO BAIXO SÃO FRANCISCO (SE)	US\$
2.4 - ESTUDO DO PROCESSO EROSIVO NAS MARGENS DO BAIXO SÃO FRANCISCO	US\$ 76.610,00
3.1 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RH NA BACIA DO RIO MARANHÃO (MG)	US\$ 23.627,00
3.2 - USO CONJUNTO DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA NA BACIA DO RIO DAS FÊMEAS (BA)	US\$ 170.620,00
3.3A - CAPACITAÇÃO PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA DE RECURSOS HÍDRICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PE)	US\$ 54.000,00
3.3B - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DA BACIA DO RIO SALTRE (BA)	US\$ 78.925,00
3.3C - APOIO À IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS COMITÊS DAS BACIAS DOS RIOS VERDE E JACARÉ (BA)	US\$
3.4 - APOIO À CRIAÇÃO DO COMITÊ DA BSF	US\$
3.5 - APOIO AO FORTALECIMENTO DO COMITÊ DA BACIA DO SÃO FRANCISCO	US\$ 64.349,10
4.1 - PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA BACIA DO SÃO FRANCISCO	US\$ 126.000,00
4.2 - AVALIAÇÃO DE MECANISMOS FINANCEIROS PARA O GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO	US\$ 89.700,00
4.3 - QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA PELO SETOR AGRÍCOLA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO	US\$ 169.500,00
4.4 - SUBSÍDIOS PARA A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS OPERACIONAIS PARA OS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO	US\$ 30.000,00
4.5 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA E DE SUA ZONA COSTEIRA/PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO	US\$ 371.000,00

Figura 2. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF São Francisco, mostrando as funções e o extrato do Projeto

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**PROJETOS LISTAGEM**

PROJETO	RECURSOS GEF	RECURSOS CONTRAPARTIDA *	TOTAL DE RECURSOS
SÃO FRANCISCO	US\$ 100.000,00	US\$ 200.000,00	US\$ 300.000,00

O PROJETO GEF SÃO FRANCISCO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E DE SUA ZONA COSTEIRA, COM BASE NA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ABORDAGEM DE GERENCIAMENTO INTEGRADO ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS.

PÁGINA 1 DE 1

Figura 3. Tela de controle do Projeto

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES

LISTAR  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

COMPONENTES  
LISTAGEM

COMPONENTE	RECURSOS GEF	RECURSOS CONTRAPARTIDA	TOTAL DE RECURSOS
0 - COORDENAÇÃO TÉCNICA AÇÃO	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00
1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA AÇÃO	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00
2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES AÇÃO	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00
3 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL AÇÃO	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00
4 - FORMULAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRÁFICA AÇÃO	US\$ 0,00	US\$ 0,00	US\$ 0,00

PÁGINA 1 DE 1

Figura 4. Tela de controle de Componentes

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS

LISTAR  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

SUBPROJETOS  
LISTAGEM

SUBPROJETO	DESCRIÇÃO	COMPONENTE	RECURSOS 2003
0.1 AÇÃO	COORDENAÇÃO TÉCNICA	0 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	US\$ 129.000,00
1.1 A AÇÃO	ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
1.1 B AÇÃO	DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
1.1 C AÇÃO	ESTUDO DA AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA NAVEGAÇÃO DO RSF NO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA AGRICULTURA NA BACIA	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
1.2 AÇÃO	IMPACTO DA MINERAÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS NO ALTO RIO DAS VELHAS (MG)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
1.3 AÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA REOFÍLICA DO BAIXO SÃO FRANCISCO	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
1.4 AÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BAIXO SÃO FRANCISCO	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
1.5 AÇÃO	IMPACTO DA AGRICULTURA NOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS NO RIO VERDE/JACARÉ (BA)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 0,00
2.1 AÇÃO	DETERMINAÇÃO DO USO DA TERRA NO BAIXO SÃO FRANCISCO (AL/SE)	2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES	US\$ 0,00
2.2 A AÇÃO	PARCERIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO SÃO PEDRO (MG)	2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES	US\$ 0,00
2.2 B AÇÃO	RECUPERANDO NOSSAS MATAS (MG)	2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES	US\$ 0,00
2.2 C AÇÃO	AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS DA CALHA DO SÃO FRANCISCO	2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES	US\$ 0,00
2.3 AÇÃO	ESTABILIZAÇÃO VEGETATIVA DAS MARGENS DO BAIXO SÃO FRANCISCO (SE)	2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES	US\$ 0,00
2.4 AÇÃO	ESTUDO DO PROCESSO EROSIVO NAS MARGENS DO BAIXO SÃO FRANCISCO	2 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DAS INSTITUIÇÕES	US\$ 0,00
3.1 AÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RH NA BACIA DO RIO MARANHÃO (MG)	3 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	US\$ 0,00
3.2 AÇÃO	USO CONJUNTO DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA NA BACIA DO RIO DAS FÊMEAS (BA)	3 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	US\$ 0,00
3.3A AÇÃO	CAPACITAÇÃO PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA DE RECURSOS HÍDRICO E EDUCAÇÃO	3 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA	US\$ 0,00

Figura 5. Tela de controle de Subprojetos

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÕES DE CONTRATO POR RESULTADO

NÚMERO	SUBPROJETO	EMPRESA/CONSULTOR	VALOR	CHECK LIST
001/2003/SF AÇÃO	1.1 A	GEORGENES HILÁRIO CAVALCANTE SEGUNDO	US\$ 1.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
002/2003/SF AÇÃO	4.5 B	CARLOS HENRIQUE ARANHA	US\$ 7.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
003/2003/SF AÇÃO	4.5 A	WOLGRAN SOARES GALVÃO	US\$ 280,00	DOCUMENTO COMPLETO
004/2003/SF AÇÃO	4.5 A	ALBANO HENRIQUE DE ARAÚJO	US\$ 1.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
005/2003/SF AÇÃO	4.5 B	RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS GARRIDO	US\$ 24.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
006/2003/SF AÇÃO	4.5 A	JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO PD: 53335	US\$ 12.600,00	DOCUMENTO COMPLETO
007/2003/SF AÇÃO	4.5 A	GUILHERME PIMENTEL HOLTZ PD: 50961	US\$ 12.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
008/2003/SF AÇÃO	0.1	LIDIANE BARRETO OLIVEIRA	US\$ 6.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
019/2002/SF AÇÃO	0.1	CÉSAR ROBERTO DE SOUZA MIRANDELA	US\$ 15.000,00	FALTA FAX
020/2002/SF AÇÃO	1.1 A	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO EXTENSÃO E PESQUISA - FUNDEPES	US\$ 45.419,00	DOCUMENTO COMPLETO
021/2002/SF AÇÃO	1.3	RIVALDO COUTO DOS SANTOS JÚNIOR	US\$ 1.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
022/2002/SF AÇÃO	1.4	DANIELA MARTINS MARLUZZO	US\$ 12.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
023/2002/SF AÇÃO	1.4	FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA	US\$ 6.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
024/2002/SF AÇÃO	1.4	MARCOS CÉSAR FERREIRA	US\$ 8.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
025/2003/SF AÇÃO	1.4	MARIA INÊS MARTINS FERREIRA	US\$ 1.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
026/2002/SF AÇÃO	1.4	OSMAR ABÍLIO DE CARVALHO JÚNIOR	US\$ 2.000,00	DOCUMENTO COMPLETO
027/2002/SF AÇÃO	1.4	RENATO PONTES GUIMARÃES	US\$ 2.000,00	DOCUMENTO COMPLETO

CONSTRUTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

Figura 6. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO

NÚMERO	SUBPROJETO	EMPRESA/CONSULTOR	DATA	VALOR
001/2003/SF AÇÃO	0.1	LIDIANE BARRETO OLIVEIRA PARCELA: 001	01/05/2003	US\$ 1.000,00
003/2003/SF AÇÃO	1.1 A	GEORGENES HILÁRIO CAVALCANTE SEGUNDO PARCELA: 001	26/03/2003	US\$ 1.000,00
004/2003/SF AÇÃO	3.3A	DÉBORAH MARIA DE ARAÚJO TRAJANO PARCELA: 004	30/01/2003	US\$ 6.500,00
005/2003/SF AÇÃO	0.1	LIDIANE BARRETO OLIVEIRA PARCELA: 002	28/03/2003	US\$ 1.000,00
006/2003/SF AÇÃO	3.3A	JOSÉ OTO DE OLIVEIRA PARCELA: 002	05/02/2003	US\$ 2.500,00
007/2003/SF AÇÃO	3.3A	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO BORBA PARCELA: 004	21/02/2003	US\$ 6.500,00
008/2003/SF AÇÃO	3.3A	LUIZ CUNHA DE OLIVEIRA PARCELA: 002	21/02/2003	US\$ 3.100,00
009/2003/SF AÇÃO	3.3A	MARISA SIMÕES LAPENDA FIGUEIROA PARCELA: 004	24/02/2003	US\$ 1.500,00
010/2003/SF AÇÃO	3.3A	MARISA SIMÕES LAPENDA FIGUEIROA PARCELA: 005	24/02/2003	US\$ 3.500,00
011/2003/SF AÇÃO	4.5 A	GUILHERME PIMENTEL HOLTZ PARCELA: 001	29/01/2003	US\$ 2.000,00
012/2003/SF AÇÃO	4.5 A	GUILHERME PIMENTEL HOLTZ PARCELA: 002	24/02/2003	US\$ 2.000,00

PÁGINA 1 DE 1

CONSTRUTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

Figura 7. Tela de controle de Solicitações de Pagamento

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES  
Contratos por Resultado  
Prestador de Serviço  
Pagamento  
Suprimento de Fundos  
Viagens  
Recursos  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

SOLICITAÇÕES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  
LISTAGEM

NÚMERO	SUBPROJETO	PERÍODO	DESPESAS PREVISTAS
001/2003/SF AÇÃO	0.1	01/01/2003 A 31/01/2003	R\$ 1.000,00

PÁGINA 1 DE 1

**Figura 8. Tela de controle de Solicitações de Suprimento de Fundos**

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES  
Contratos por Resultado  
Prestador de Serviço  
Pagamento  
Suprimento de Fundos  
Viagens  
Recursos  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

SOLICITAÇÕES DE VIAGEM  
LISTAGEM

NÃO HÁ SOLICITAÇÕES DE VIAGEM CADASTRADAS.

**Figura 9. Tela de controle de Solicitações de Viagem**

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÕES DE RECURSOS  
LISTAGEM

NÚMERO	SUBPROJETO	RUBRICA	VALOR (US\$)
001/2003/SF AÇÃO	0.1	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	US\$ 512,00
002/2003/SF AÇÃO	0.1	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	US\$ 1.000,00
003/2003/SF AÇÃO	3.3A	5202 - RELATÓRIO	US\$ 1.000,00
004/2003/SF AÇÃO	2.2 A	5202 - RELATÓRIO	US\$ 1.000,00
005/2003/SF AÇÃO	1.4	5202 - RELATÓRIO	US\$ 1.000,00
006/2003/SF AÇÃO	4.1	3302 - WORKSHOP	US\$ 9.100,00
007/2002/SF AÇÃO	4.5	3302 - WORKSHOP	US\$ 4.000,00
008/2003/SF AÇÃO	4.5	1601 - VIAGENS	US\$ 2.000,00
009/2002/SF AÇÃO	1.5	1602 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	US\$ 600,00
010/2002/SF AÇÃO	3.2	1602 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	US\$ 1.090,00
011/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 168,00
012/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 560,00
013/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 6.569,00
014/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 6.030,00
015/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 1.178,00
016/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 1.488,17
017/2002/SF AÇÃO	1.5	1601 - VIAGENS	US\$ 1.040,00

CONTRATOS POR RESULTADO  
PRESTADOR DE SERVIÇO  
PAGAMENTO  
SUPRIMENTO DE FUNDOS  
VIAGENS  
RECURSOS  
INCLUIR  
ALTERAR  
PESQUISA SIMPLES  
PESQUISA AVANÇADA  
RELATÓRIOS  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

Figura 10 - Tela de controle de Solicitação de Recursos

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES

SOLICITAÇÕES  
INCLUIR

ESCOLHA A SOLICITAÇÃO:

- SOLICITAÇÃO DE CONTRATO POR RESULTADO - SCR - PESSOA JURÍDICA
- SOLICITAÇÃO DE CONTRATO POR RESULTADO - SCR - PESSOA FÍSICA
- SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SP - PESSOA JURÍDICA
- SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SP - PESSOA FÍSICA
- SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SF
- SOLICITAÇÃO DE VIAGEM PARA SUBPROJETOS - SV
- SOLICITAÇÃO DE RECURSOS - SR

CONTRATOS POR RESULTADO  
PRESTADOR DE SERVIÇO  
PAGAMENTO  
SUPRIMENTO DE FUNDOS  
VIAGENS  
RECURSOS  
INCLUIR  
ALTERAR  
PESQUISA SIMPLES  
PESQUISA AVANÇADA  
RELATÓRIOS  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

Figura 11 - Tela de inclusão de Solicitações

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES

Contratos por Resultado  
Prestador de Serviço  
Pagamento  
Suprimento de Fundos  
Viagens  
Recursos  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

	<b>PROJETO GEF SÃO FRANCISCO</b> ANA/GEF/PNUMA/OEA	
	COORDENAÇÃO TÉCNICA	

**SOLICITAÇÃO DE CONTRATO POR RESULTADO - SCR** Nº 001/2003  
PESSOA FÍSICA

Data: 06/04/2003

SUBPROJETO Nº: 1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE

Organização  
Responsável:  
Coordenador: Arno Maschmann de Oliveira

Consultor: GEORGENES HILARIO CAVALCANTE SEGUNDO  
CPF: 924.659.194-15

Endereço: RUA ERNESTO GOMES MARANHÃO, 464 Bairro: JATIÚCA  
Cidade: MACEIÓ - AL  
Telefone: (82) 327-2714  
Fax:  
E-mail: seggs@bol.com.br

Data de Início do CPR: 22/01/2003  
Data de Término do CPR: 22/02/2003  
Local de Trabalho: MACEIÓ-AL  
Valor Total do Contrato: US\$ 1.000,00

Figura 12. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES

Contratos por Resultado  
Prestador de Serviço  
Pagamento  
Suprimento de Fundos  
Viagens  
Recursos  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

	<b>PROJETO GEF SÃO FRANCISCO</b> ANA/GEF/PNUMA/OEA	
	COORDENAÇÃO TÉCNICA	

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO** Nº 001/2003  
Data: 04/04/2003

PARA: Paulo Cavalcanti - Oficial de Serviços/OEA  
DE: Antônio Félix Domingues - Diretor Nacional  
ASSUNTO: Solicitação Pagamento de CPR  
Subprojeto: 0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

Solicito o pagamento de CPR, conforme abaixo especificado:

RUBRICA:	ITEM	VALOR US\$
1201	CONSULTORES	US\$ 1.000,00

NOME DO CONTRATADO: LIDIANE BARRETO OLIVEIRA  
CPF: 658.226.681-00  
ATIVIDADE: 1ª Parcela de CPR  
CPR:  
PO:  
VALOR EM US\$ US\$ 1.000,00  
DADOS BANCÁRIOS: Banco: BRB - Banco de Brasília S/A Agência: 059 Conta-Corrente: 102693-7

Figura 13. Impressão da Solicitação de Pagamento

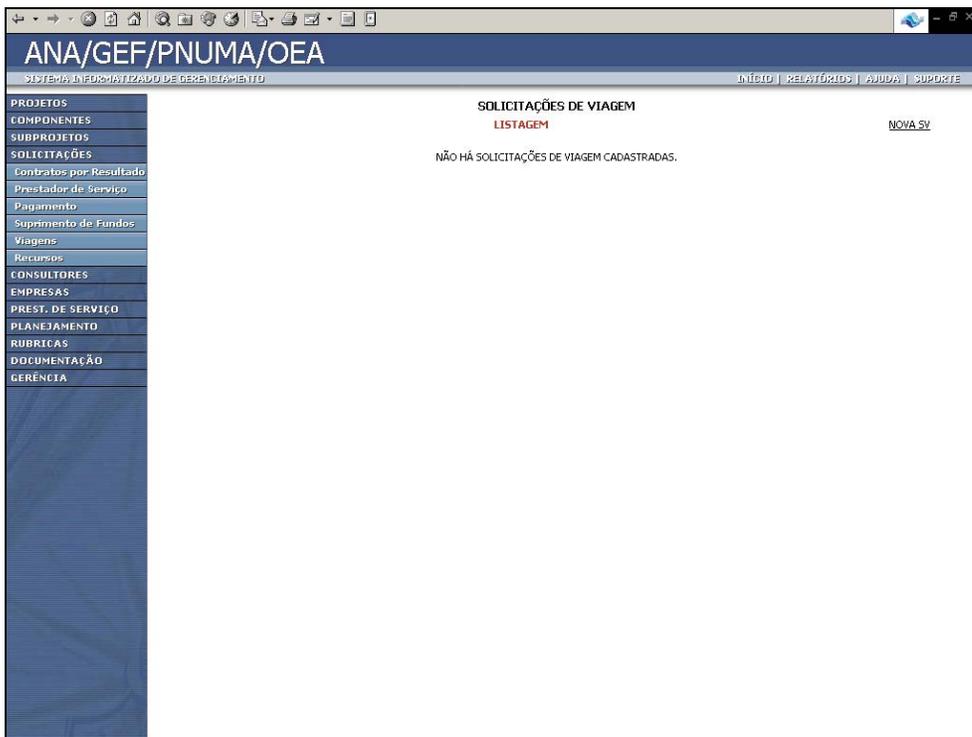


Figura 14. Impressão da Solicitação de Viagem

CPF	NOME	SUBPROJETOS	SITUAÇÃO
048.636.664-20	ADERALDO DE SOUZA SILVA	1.4	NÃO POSSUI CURRICULUM.
818.793.344-53	ADRIANA SALES REIS	1.1 A	CADASTRO COMPLETO.
368.885.241-91	ALBANO HENRIQUE DE ARAÚJO	4.5 A	CADASTRO COMPLETO.
1000	ALCEU PEDROTTI	2.4	NÃO POSSUI CURRICULUM.
999.593.566-04	ALESSANDRO DE FREITAS TEIXEIRA	4.3	CADASTRO COMPLETO.
021.914.264-50	ANA CECÍLIA VALENÇA CAHÚ	0.1	CADASTRO COMPLETO.
111.879.725-68	ANA LÚCIA FERRAZ DE MENEZES	3.5	CADASTRO COMPLETO.
148.590.538-93	ANDERSON SOARES PEREIRA	1.4	NÃO POSSUI CURRICULUM.
443.698.595-49	ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA	3.3B	CADASTRO COMPLETO.
176.180.290-91	ARNO MASCHMANN DE OLIVEIRA	4.5	CADASTRO COMPLETO.
027.648.184-40	ARTHUR DE OLIVEIRA HERNANDEZ	1.1 A	CADASTRO COMPLETO.
405.220.169-87	BASTIAAN ADRIAAN KNOPERS	1.1 B	CADASTRO COMPLETO.
xx	BRUNO OLIVEIRA MIRANDA	2.2 B	CADASTRO COMPLETO.
024.660.665-75	CARLOS AUGUSTO BARROS GARBOGGINI	3.3B	CADASTRO COMPLETO.
037.128.858-49	CARLOS EDUARDO ORSINI NUNES DE LIMA	3.1	CADASTRO COMPLETO.
877.077.648-20	CARLOS HENRIQUE ARANHA	4.5 B	CADASTRO COMPLETO.
101.689.405-82	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA COUTO MEDEIROS	3.3B	CADASTRO COMPLETO.

Figura 15. Tela de controle de Consultores

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

EMPRESAS  
LISTAGEM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	SUBPROJETOS	SITUAÇÃO
04.493.073/0001-13 AÇÃO	JC EMPREENDIMENTOS NÁUTICOS LTDA	2.4	FALTA SUPPLIER
02.279.364/0001-88 AÇÃO	NÓBILIS COMERCIAL LTDA	3.3B	FALTA SUPPLIER
64.345.853/0001-48 AÇÃO	TELETRÔNICA	4.3	FALTA SUPPLIER
02.997.217/0001-43 AÇÃO	100 OPÇÕES	4.3	FALTA SUPPLIER
04.232.455/0001-93 AÇÃO	AGÊNCIA CLICK BRASÍLIA LTDA	4.5	FALTA SUPPLIER
714.466.640-15 AÇÃO	AGENCY 5 PRODUÇÕES	4.5	CADASTRO COMPLETO.
01.727.390/0001-69 AÇÃO	ALESSANDRA MARA FIRMINO-ME	4.5	NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA. FALTA SUPPLIER
00.595.973/0001-10 AÇÃO	AMD INFORMÁTICA LTDA	4.3	FALTA SUPPLIER
00.398.842/0001-43 AÇÃO	ATLANTE PAPELARIA LTDA	0.1	FALTA SUPPLIER
25.329.731/0001-06 AÇÃO	AUTO REVENDEDORA LTDA	4.3	FALTA SUPPLIER
42.034.777/0006-21 AÇÃO	BIT SHOP INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.4	FALTA SUPPLIER
20.771.747/0025-28 AÇÃO	CAF SANTA BÁRBARA	2.2 B	FALTA SUPPLIER
63.025.530/0083-50 AÇÃO	CENA – CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR DA AGRICULTURA DA USP	3.2	NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.
01.115.558/0001-85 AÇÃO	CONSULCOOP COOPERATIVA DE CONSULTORES LTDA.	4.5 A	NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.
01.644.731/0001-32 AÇÃO	CTIS INFORMÁTICA LTDA	0.1	FALTA SUPPLIER
16.571.085/0001-06 AÇÃO	DELGITEC ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	0.1	FALTA SUPPLIER
02.044.804/0001-05 AÇÃO	ECONSULT ENGENHARIA AMBIENTAL S/C LTDA.	2.2 A	NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.

Figura 16. Tela de controle de Empresas

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

PLANEJAMENTO - POA  
LISTAGEM

SUBPROJETO	RUBRICA	ANO	RECURSOS
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	4201 - MATERIAL PERMANENTE	2002	65.000,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	5102 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2002	3.000,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	2201 - RELATÓRIO FINAL	2002	1.000,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	1201 - CONSULTORES	2003	0,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	1201 - CONSULTORES	2002	83.660,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	1601 - VIAGENS	2002	11.970,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	2002	6.000,00
1.1 A - ESTUDO HIDRODINÂMICO-SEDIMENTOLÓGICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, DO ESTADUÁRIO E DE SUA ZONA COSTEIRA ADJACENTE AÇÃO	5301 - COMUNICAÇÃO	2002	84,00
1.1 B - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE AÇÃO	1201 - CONSULTORES	2002	31.690,00
1.1 B - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE AÇÃO	1601 - VIAGENS	2002	13.400,00
1.1 B - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE AÇÃO	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	2002	500,00
1.1 B - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE AÇÃO	4201 - MATERIAL PERMANENTE	2002	1.000,00
1.1 B - DETERMINAÇÃO DA CARGA DE NUTRIENTES DO RIO SÃO FRANCISCO NA REGIÃO DA FOZ E O IMPACTO DAS CHEIAS ARTIFICIAIS NO SEU CONTROLE AÇÃO	5102 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2002	1.000,00

Figura 17. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS

COMPONENTES

SUBPROJETOS

SOLICITAÇÕES

CONSULTORES

EMPRESAS

PREST. DE SERVIÇO

PLANEJAMENTO

RUBRICAS

LISTAR

INCLUIR

PESQUISA SIMPLES

PESQUISA AVANÇADA

RELATÓRIOS

DOCUMENTAÇÃO

GERÊNCIA

RUBRICAS LISTAGEM

CÓDIGO	RUBRICA	OBSERVAÇÕES
1101 AÇÃO	COORDENADOR TÉCNICO	-
1102 AÇÃO	COORDENADOR TÉCNICO ADJUNTO	-
1103 AÇÃO	SECRETARIA	-
1201 AÇÃO	CONSULTORES	-
1601 AÇÃO	VIAGENS	-
1602 AÇÃO	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-
2201 AÇÃO	RELATÓRIO FINAL	-
3302 AÇÃO	WORKSHOP	-
4101 AÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	-
4201 AÇÃO	MATERIAL PERMANENTE	-
5101 AÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	-
5102 AÇÃO	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-
5202 AÇÃO	RELATÓRIO	-
5301 AÇÃO	COMUNICAÇÃO	-
5302 AÇÃO	CORREIO	-

PÁGINA 1 DE 1

Figura 18. Tela de controle de Rubricas

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

PROJETOS

COMPONENTES

SUBPROJETOS

SOLICITAÇÕES

CONSULTORES

EMPRESAS

PREST. DE SERVIÇO

PLANEJAMENTO

RUBRICAS

DOCUMENTAÇÃO

LISTAR

INCLUIR

PESQUISA SIMPLES

PESQUISA AVANÇADA

RELATÓRIOS

GERÊNCIA

REPOSITÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARQUIVO	INCLUIDO POR	DATA DE INCLUSÃO
	001 AÇÃO	GUIA OPERATIVO COMPLETO	Guia_texto.doc	SÃO FRANCISCO	09/04/2003 07:55
	002 AÇÃO	PARECER TÉCNICO DO COORDENADOR DO SUBPROJETO	Parecer Técnico do Coordenador do Subprojeto.doc	SÃO FRANCISCO	09/04/2003 07:56
	003 AÇÃO	SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE RESULTADO - PESSOA FÍSICA	Solicitação de Contrato de Resultado - Pessoa Física.doc	SÃO FRANCISCO	09/04/2003 07:57
	005 AÇÃO	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - SP	Solicitação de Pagamento - SP.doc	SÃO FRANCISCO	09/04/2003 08:00

Figura 19. Tela do Repositório de Documentação do Projeto

### 3.2. Telas Sistema GEF Pantanal/Alto Paraguai

Para demonstrar alguns aspectos do Sistema Informações Gerenciais do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai são apresentadas as principais telas.

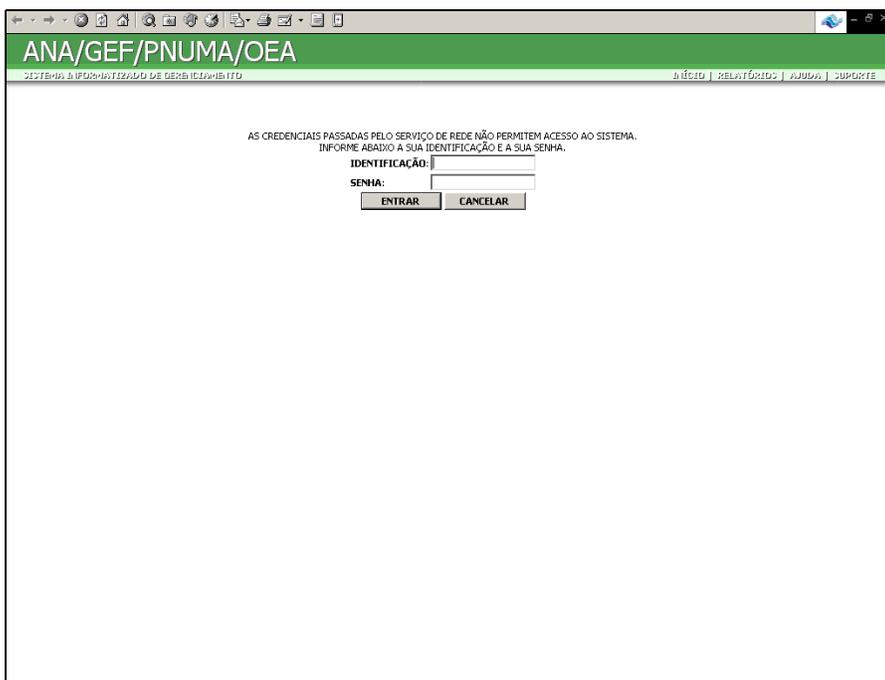


Figura 20. Entrada do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF Pantanal/ Alto Paraguai

**PROJETO PANTANAL / ALTO PARAGUAI**

O OBJETIVO DO PROJETO GEF ALTO PARAGUAI É O DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, ASSIM COMO APOIAR OS CUSTOS INCREMENTAIS DAS MEDIDAS IDENTIFICADAS NO PLANO DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO ALTO PARAGUAI - PCBAP E INCORPORÁ-LAS EM UM PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - PAE (STRATEGIC ACTION PLAN - SAP, EM INGLÊS), QUE LEVE EM CONTA AS QUESTÕES AMBIENTAIS PRIORITÁRIAS PRESENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA.

PLANEJAMENTO ANUAL						
ANO	VALOR PREVISTO:	VALOR ALOCADO EM CPR:	VALOR PAGO/UTILIZADO:	SALDO EM ALOCAÇÃO:	SALDO FINANCEIRO:	
2003	US\$ 3.090.486,00	US\$ 1.048.377,88	US\$ 40.150,00	US\$ 2.042.106,12	US\$ 3.050.336,00	

SUBPROJETOS						
SUBPROJETO	RECURSOS PREVISTOS	VALOR ALOCADO	SALDO EM ALOCAÇÃO	VALOR PAGO	SALDO FINANCEIRO	
0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	US\$ 1.157.428,00	US\$ 50.800,00	US\$ 1.106.628,00	US\$ 14.550,00	US\$ 1.142.878,00	
1.1 - FORMULAÇÃO DE MEIOS PARA PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA PESCA NO RIO TAQUARI (MS)	US\$ 34.062,00	US\$ 5.475,00	US\$ 28.587,00	US\$ 0,00	US\$ 34.062,00	
1.2 - AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO RIO TAQUARI (MS)	US\$ 313.533,00	US\$ 86.000,00	US\$ 227.533,00	US\$ 0,00	US\$ 313.533,00	
1.3 - AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA TRANSFRONTEIRIÇA DO RIO APA (MS)	US\$ 78.476,00	US\$ 23.230,00	US\$ 55.246,00	US\$ 0,00	US\$ 78.476,00	
1.4 - DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE MERCÚRIO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI (MT)	US\$ 108.838,00	US\$ 0,00	US\$ 108.838,00	US\$ 0,00	US\$ 108.838,00	
1.5 - DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE AGROQUÍMICOS E METAIS PESADOS NA BACIA DO ALTO PARAGUAI	US\$ 262.095,00	US\$ 0,00	US\$ 262.095,00	US\$ 0,00	US\$ 262.095,00	
1.6 MS - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NAS VIZINHANÇAS DAS CIDADES DE CORUMBÁ E CUIABÁ (MS)	US\$ 140.296,00	US\$ 0,00	US\$ 140.296,00	US\$ 0,00	US\$ 140.296,00	
1.6 MT - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NAS VIZINHANÇAS DAS CIDADES DE CORUMBÁ E CUIABÁ (MT)	US\$ 81.218,00	US\$ 0,00	US\$ 81.218,00	US\$ 0,00	US\$ 81.218,00	
1.7 - SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNITÁRIOS RELACIONADOS COM OS ARBONDADOS NA BACIA DO RIO TAQUARI (MS)	US\$ 62.802,00	US\$ 20.000,00	US\$ 42.802,00	US\$ 0,00	US\$ 62.802,00	
2.1 - PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ZONAS TAMPÃO NAS VIZINHANÇAS DAS RESERVAS NATURAIS DE ACURIZAL, PENHA E DOROCHE (MT/MS)	US\$ 180.912,00	US\$ 0,00	US\$ 180.912,00	US\$ 0,00	US\$ 180.912,00	
2.2 - IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM MATO GROSSO DO SUL (MS)	US\$ 179.243,00	US\$ 20.000,00	US\$ 159.243,00	US\$ 0,00	US\$ 179.243,00	
2.3 - PLANEJAMENTO ECORREGIONAL DO PANTANAL (MT/MS)	US\$ 125.208,00	US\$ 0,00	US\$ 125.208,00	US\$ 0,00	US\$ 125.208,00	
2.4 - MEDIDAS PARA O GERENCIAMENTO DO COMÉRCIO DE ANIMAIS VIVOS NO PANTANAL (MT/MS)	US\$ 53.125,00	US\$ 0,00	US\$ 53.125,00	US\$ 0,00	US\$ 53.125,00	
3.1 A - MANEJO DO SOLO E EROÇÃO DO SOLO NA BACIA DO ALTO TAQUARI (MS)	US\$ 268.297,00	US\$ 27.539,00	US\$ 240.758,00	US\$ 0,00	US\$ 268.297,00	
3.1 B - MONITORAMENTO DE ÁREAS MANEJADAS EM SISTEMA DE PLANTIO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI (MS)	US\$ 85.854,00	US\$ 5.000,00	US\$ 80.854,00	US\$ 0,00	US\$ 85.854,00	
3.2 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA REABILITAR TERRAS						

Figura 21. Tela Inicial do Sistema Informatizado de Gerenciamento do Projeto GEF Pantanal/Alto Paraguai, mostrando as funções e o extrato do Projeto

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**PROJETOS**

LISTAGEM

PROJETO	RECURSOS GEF	RECURSOS CONTRAPARTIDA *	TOTAL DE RECURSOS
PANTANAL/ALTO PARAGUAI	US\$ 6.615.000,00	US\$ 9.788.000,00	US\$ 16.403.000,00

O OBJETIVO DO PROJETO GEF ALTO PARAGUAI É O DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, ASSIM COMO APOIAR OS CUSTOS INCREMENTAIS DAS MEDIDAS IDENTIFICADAS NO PLANO DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO ALTO PARAGUAI - PCBAP E INCORPORÁ-LAS EM UM PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - PAE (STRATEGIC ACTION PLAN - SAP, EM INGLÊS), QUE LEVE EM CONTA AS QUESTÕES AMBIENTAIS PRIORITÁRIAS PRESENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA.

PÁGINA 1 DE 1

Figura 22. Tela de controle do Projeto

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**COMPONENTES**

LISTAGEM

COMPONENTE	RECURSOS GEF	RECURSOS CONTRAPARTIDA	TOTAL DE RECURSOS
0 - GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO	US\$ 736.000,00	US\$ 212.000,00	US\$ 948.000,00
1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA	US\$ 1.141.000,00	US\$ 1.668.000,00	US\$ 2.809.000,00
2 - CONSERVAÇÃO DO PANTANAL	US\$ 455.000,00	US\$ 1.474.000,00	US\$ 1.929.000,00
3 - DEGRADAÇÃO DA TERRA	US\$ 916.000,00	US\$ 892.000,00	US\$ 1.808.000,00
4 - ENVOLVIMENTO DOS INTERESSADOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	US\$ 448.000,00	US\$ 990.000,00	US\$ 1.438.000,00
5 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	US\$ 1.899.000,00	US\$ 1.099.000,00	US\$ 2.998.000,00
6 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE BACIA HIDROGRÁFICA - PGI/PAE	US\$ 1.020.000,00	US\$ 2.203.000,00	US\$ 3.223.000,00

PÁGINA 1 DE 1

Figura 23. Tela de controle de Componentes

ANA/GEF/PNUMA/OEA			
PROJETOS		SUBPROJETOS	
COMPONENTES		LISTAGEM	
SUBPROJETOS		RECURSOS	
LISTAR	SUBPROJETO	DESCRIÇÃO	COMPONENTE
Incluir	0.1	COORDENAÇÃO TÉCNICA	0 - GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO
Alterar	AÇÃO		US\$ 329.100,00
Pesquisa Simples	1.1	FORMULAÇÃO DE MEIOS PARA PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA PESCA NO RIO TAQUARI (MS)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
Pesquisa Avançada	AÇÃO		US\$ 5.820,00
Relatórios	1.2	AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO RIO TAQUARI (MS)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
SOLICITAÇÕES	AÇÃO		US\$ 127.469,00
CONSULTORES	1.3	AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA TRANSFRONTEIRIÇA DO RIO APA (MS)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
EMPRESAS	AÇÃO		US\$ 27.527,00
PREST. DE SERVIÇO	1.4	DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE MERCÚRIO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI (MT)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
PLANEJAMENTO	AÇÃO		US\$ 34.552,00
RUBRICAS	1.5	DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE AGROQUÍMICOS E METAIS PESADOS NA BACIA DO ALTO PARAGUAI	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
DOCUMENTAÇÃO	AÇÃO		US\$ 50.586,00
GERÊNCIA	1.6 MS	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NAS VIZINHANÇAS DAS CIDADES DE CORUMBÁ E CUIABÁ (MS)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
	AÇÃO		US\$ 38.796,00
	1.6 MT	GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NAS VIZINHANÇAS DAS CIDADES DE CORUMBÁ E CUIABÁ (MT)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
	AÇÃO		US\$ 36.357,00
	1.7	SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNITÁRIOS RELACIONADOS COM OS ARROBADOS NA BACIA DO RIO TAQUARI (MS)	1 - ANÁLISE AMBIENTAL DA BACIA
	AÇÃO		US\$ 31.401,00
	2.1	PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ZONAS TAMPÃO NAS VIZINHANÇAS DAS RESERVAS NATURAIS DE AÇURIZAL, PENHA E DORÓCHÊ (MT/MS)	2 - CONSERVAÇÃO DO PANTANAL
	AÇÃO		US\$ 78.870,00
	2.2	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM MATO GROSSO DO SUL (MS)	2 - CONSERVAÇÃO DO PANTANAL
	AÇÃO		US\$ 57.444,00
	2.3	PLANEJAMENTO ECORREGIONAL DO PANTANAL (MT/MS)	2 - CONSERVAÇÃO DO PANTANAL
	AÇÃO		US\$ 43.214,00
	2.4	MEDIDAS PARA O GERENCIAMENTO DO COMÉRCIO DE ANIMAIS VIVOS NO PANTANAL (MT/MS)	2 - CONSERVAÇÃO DO PANTANAL
	AÇÃO		US\$ 16.473,00
	3.1 A	MANEJO DO SOLO E EROSOÃO DO SOLO NA BACIA DO ALTO TAQUARI (MS)	3 - DEGRADAÇÃO DA TERRA
	AÇÃO		US\$ 97.257,00
	3.1 B	MONITORAMENTO DE ÁREAS MANEJADAS EM SISTEMA DE PLANTIO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI (MS)	3 - DEGRADAÇÃO DA TERRA
	AÇÃO		US\$ 41.305,00
	3.2	DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA REABILITAR TERRAS DEGRADADAS POR ATIVIDADES MINERADORAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ (MT)	3 - DEGRADAÇÃO DA TERRA
	AÇÃO		US\$ 145.162,00
	3.3	DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE REABILITAÇÃO DE TERRAS RIBEIRINHAS (MT)	3 - DEGRADAÇÃO DA TERRA
			US\$ 46.696,00

Figura 24. Tela de controle de Subprojetos

ANA/GEF/PNUMA/OEA			
PROJETOS		SOLICITAÇÕES DE CONTRATO POR RESULTADO	
COMPONENTES		LISTAGEM	
SUBPROJETOS		NOVA SCCR	
SOLICITAÇÕES	NÚMERO	SUBPROJETO	EMPRESA/CONSULTOR
Contratos por Resultado	001/2003/AP	0.1	ANA BEATRIZ BUCCO TALLARICO PD: 52672 CPR: 40244
	AÇÃO		US\$ 7.500,00 DOCUMENTO COMPLETO
Prestador de Serviço	022/2002/AP	3.2	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA CPR: 06/3.2/02
Pagamento	AÇÃO		US\$ 3.000,00 DOCUMENTO COMPLETO
Suprimento de Fundos	025/2002/AP	3.2	ANTÔNIO DA SILVA LISBOA CPR: 03/3.2/02
Viagens	AÇÃO		US\$ 1.950,00 DOCUMENTO COMPLETO
Recursos	040/2002/AP	4.2	ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA MELGASSENSE-AMEC
Incluir	AÇÃO		US\$ 15.388,00 FALTA FAX
Alterar	029/2002/AP	9.4	BENEDITO EDUARDO BARBOSA PEREIRA CPR: 01/9.1/02
Pesquisa Simples	AÇÃO		US\$ 4.200,00 DOCUMENTO COMPLETO
Pesquisa Avançada	039/2002/AP	4.2	BRUNHILD ANGELIKA JUNCKE CPR: 02/3.2/02
Relatórios	AÇÃO		US\$ 998,00 DOCUMENTO COMPLETO
CONSULTORES	010/2003/AP	9.4	CARLA CHRISTIANE DIAS LIMA DO AMARAL CPR: 07/9.4A/03
EMPRESAS	AÇÃO		US\$ 800,00 DOCUMENTO COMPLETO
PREST. DE SERVIÇO	019/2002/AP	9.4	CLEBER JOSÉ RODRIGUES ALHO CPR: 01/9.4/02
PLANEJAMENTO	AÇÃO		US\$ 15.000,00 DOCUMENTO COMPLETO
RUBRICAS	037/2002/AP	3.4	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA- CIDEMA
DOCUMENTAÇÃO	AÇÃO		US\$ 16.373,00 FALTA FAX
GERÊNCIA	048/2002/AP	7.5	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA- CIDEMA
	AÇÃO		US\$ 5.000,00 FALTA FAX
	049/2002/AP	7.5	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA- CIDEMA
	AÇÃO		US\$ 15.500,00 FALTA FAX
	044/2002/AP	6.1	CONVEX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
	AÇÃO		US\$ 25.000,00 DOCUMENTO COMPLETO
	043/2002/AP	5.1 MT	COOPERATIVA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS EM SANEAMENTO BÁSICO LTDA-COPERSERV
	AÇÃO		US\$ 9.000,00 DOCUMENTO COMPLETO
	047/2002/AP	7.4 MT	COOPERATIVA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS EM SANEAMENTO BÁSICO LTDA-COPERSERV
	AÇÃO		US\$ 26.492,00 FALTA TERMO DE REFERÊNCIA
	034/2002/AP	3.2	COOPERATIVA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS EM SANEAMENTO BÁSICO LTDA-COPERSERV
	AÇÃO		US\$ 4.900,00 DOCUMENTO COMPLETO
	035/2002/AP	3.2	COOPERATIVA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS EM SANEAMENTO BÁSICO LTDA-COPERSERV
	AÇÃO		US\$ 35.051,00 FALTA FAX
	036/2002/AP	3.3	COOPERATIVA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS EM SANEAMENTO BÁSICO LTDA-
			US\$ 32.200,00 DOCUMENTO

Figura 25. Tela de controle de Solicitações de Contrato por Resultado

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO**

LISTAGEM

NÚMERO	SUBPROJETO	EMPRESA/CONSULTOR	DATA	VALOR
003/2003/AP AÇÃO	0.1	ANA BEATRIZ BUCCO TALLARICO PARCELA: 001	31/01/2003	US\$ 1.250,00
008/2003/AP AÇÃO	0.1	ANA BEATRIZ BUCCO TALLARICO PARCELA: 002	25/02/2003	US\$ 1.250,00
011/2003/AP AÇÃO	0.1	ANA BEATRIZ BUCCO TALLARICO PARCELA: 003	28/03/2003	US\$ 1.250,00
009/2003/AP AÇÃO	9.4	FELIPE AUGUSTO DIAS PARCELA: 002	25/02/2003	US\$ 2.000,00
005/2003/AP AÇÃO	9.4	FELIPE AUGUSTO DIAS PARCELA: 001	06/02/2003	US\$ 2.000,00
013/2003/AP AÇÃO	9.4	FELIPE AUGUSTO DIAS PARCELA: 003	01/04/2003	US\$ 2.000,00
002/2003/AP AÇÃO	0.1	HELOISA SANFOLIN PARCELA: 001	28/01/2003	US\$ 600,00
006/2003/AP AÇÃO	0.1	HELOISA SANFOLIN PARCELA: 002	25/02/2003	US\$ 600,00
010/2003/AP AÇÃO	0.1	HELOISA SANFOLIN PARCELA: 003	26/03/2003	US\$ 600,00
012/2003/AP AÇÃO	0.1	HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES PARCELA: 003	01/04/2003	US\$ 3.000,00
007/2003/AP AÇÃO	0.1	HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES PARCELA: 002	25/02/2003	US\$ 3.000,00
004/2003/AP AÇÃO	0.1	HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES PARCELA: 001	06/02/2003	US\$ 3.000,00
014/2003/AP AÇÃO	9.3 A	TDA DESENHO & ARTE PARCELA: 001	28/02/2003	US\$ 9.600,00

PÁGINA 1 DE 1

Figura 26. Tela de controle de Solicitações de Pagamento

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**SOLICITAÇÕES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

LISTAGEM

NÚMERO	SUBPROJETO	PERÍODO	DESPESAS PREVISTAS
002/2003/AP AÇÃO	0.1	22/05/2003 A 30/05/2003	R\$

PÁGINA 1 DE 1

Figura 27. Tela de controle de Solicitações de Suprimento de Fundos

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**SOLICITAÇÕES DE VIAGEM**

LISTAGEM

NÚMERO	SUBPROJETO	CONSULTOR	PERÍODO
001/2003/AP AÇÃO	9.4	CARLA CHRISTIANE DIAS LIMA DO AMARAL	01/05/2003 A 02/05/2003

PÁGINA 1 DE 1

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES  
Contratos por Resultado  
Prestador de Serviço  
Pagamento  
Suprimento de Fundos  
Viagens  
Recursos  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

Figura 28. Tela de controle de Solicitações de Viagem

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

**SOLICITAÇÕES DE RECURSOS**

LISTAGEM

NÚMERO	SUBPROJETO	RUBRICA	VALOR (US\$)
003/2003/AP AÇÃO	9.4	1601 - VIAGENS	US\$ 10.000,00
006/2003/AP AÇÃO	0.1	1601 - VIAGENS	US\$ 10.000,00
014/2002/AP AÇÃO	9.4	1601 - VIAGENS	US\$ 15.000,00
013/2002/AP AÇÃO	9.4	3302 - WORKSHOP	US\$ 2.000,00
002/2003/AP AÇÃO	9.4	3302 - WORKSHOP	US\$ 15.000,00
001/2002/AP AÇÃO	9.4	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	US\$ 370,00
004/2002/AP AÇÃO	9.4	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	US\$ 520,00
005/2002/AP AÇÃO	9.4	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	US\$ 245,00
007/2003/AP AÇÃO	0.1	4101 - MATERIAL DE CONSUMO	US\$ 500,00
008/2003/AP AÇÃO	0.1	4201 - EQUIPAMENTOS	US\$ 2.000,00
017/2003/AP AÇÃO	0.1	4201 - MATERIAL PERMANENTE	US\$ 2.000,00
015/2002/AP AÇÃO	3.1 A	4201 - EQUIPAMENTOS	US\$ 25.150,00
011/2002/AP AÇÃO	3.1 A	4201 - EQUIPAMENTOS	US\$ 11.540,00
012/2002/AP AÇÃO	9.4	5220 - IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS	US\$ 250,00
016/2002/AP AÇÃO	9.3 C	5220 - IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS	US\$ 16.045,00
009/2003/AP AÇÃO	0.1	5220 - IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS	US\$ 2.000,00
010/2003/AP AÇÃO	0.1	5301 - CORREIOS	US\$ 3.000,00

PROJETOS  
COMPONENTES  
SUBPROJETOS  
SOLICITAÇÕES  
Contratos por Resultado  
Prestador de Serviço  
Pagamento  
Suprimento de Fundos  
Viagens  
Recursos  
Incluir  
Alterar  
Pesquisa Simples  
Pesquisa Avançada  
Relatórios  
CONSULTORES  
EMPRESAS  
PREST. DE SERVIÇO  
PLANEJAMENTO  
RUBRICAS  
DOCUMENTAÇÃO  
GERÊNCIA

Figura 29. Tela de controle de Solicitação de Recursos

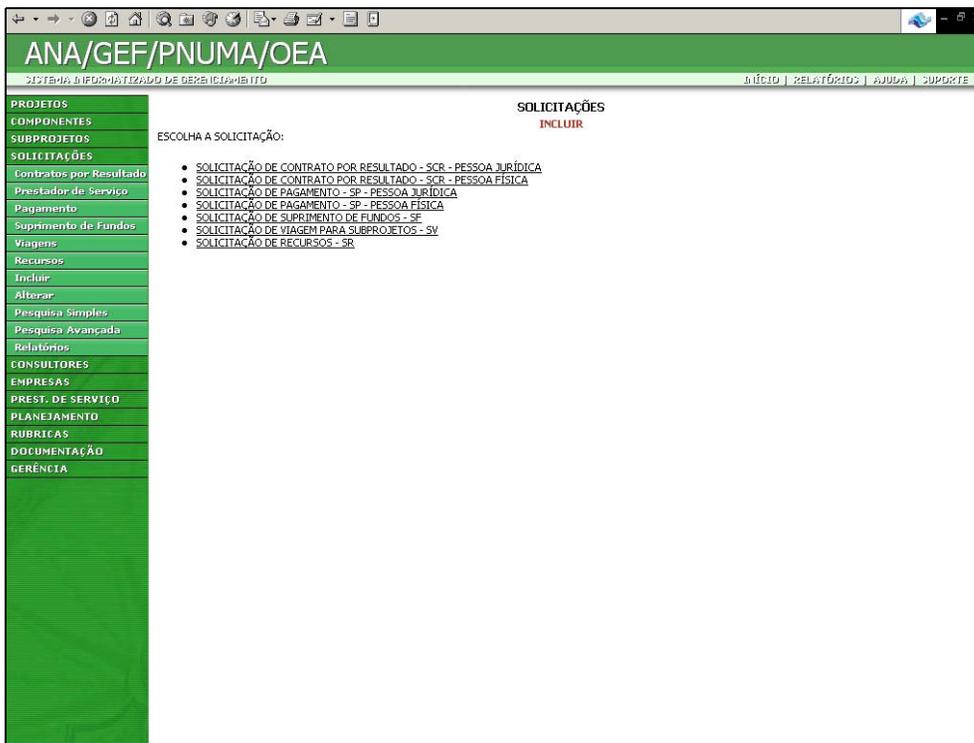


Figura 30. Tela de inclusão de Solicitações



Figura 31. Impressão da Solicitação de Contrato por Resultado

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

PRÓJETO GEF PANTANAL/ALTO PARAGUAI ANA/GEF/PNUMA/OEA

COORDENAÇÃO TÉCNICA  
Rua 9 de julho, 1922. Vila Ipiranga  
79081-050. Campo Grande - MS  
Telefax: (67) 346-2100 E-mail: gefaltoparaguai@aol.com

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO** Nº 003/2003  
Data: 10/04/2003

PARA: Paulo Cavalcanti – Oficial de Serviços/OEA  
DE: Antônio Félix Domingues – Diretor Nacional  
ASSUNTO: Solicitação Pagamento de CPR  
Subprojeto: 0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

Solicito o pagamento de CPR, conforme abaixo especificado:

RUBRICA:	ITEM	VALOR US\$
1201	CONSULTORES	US\$ 1.250,00

NOME DO CONTRATADO: ANA BEATRIZ BUCCO TALLARICO  
CPF: 462.602.341-04  
ATIVIDADE: 1ª Parcela de CPR  
CPR: 40244  
PO: 52672  
VALOR EM US\$ US\$ 1.250,00  
DADOS BANCÁRIOS: Banco: Banco HSBC Bamerindus S/A Agência: 1276 Conta-Corrente: 0495444

Figura 32. Impressão da Solicitação de Pagamento

ANA/GEF/PNUMA/OEA  
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

PRÓJETO GEF PANTANAL/ALTO PARAGUAI ANA/GEF/PNUMA/OEA

COORDENAÇÃO TÉCNICA  
Rua 9 de julho, 1922. Vila Ipiranga  
79081-050. Campo Grande - MS  
Telefax: (67) 346-2100 E-mail: gefaltoparaguai@aol.com

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM PARA SUBPROJETOS** Nº 001/2003  
Data: 08/04/2003

SUBPROJETO Nº:  
Nome: 9.4 - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ANALÍTICO DA BACIA DO ALTO PARAGUAI

CONSULTOR: CARLA CHRISTIANE DIAS LIMA DO AMARAL  
Telefones para contato: (67) 326-8133 Celular: (67) 8112-0857

Tipo de Transporte: AÉREO Período: 01/05/2003 a 02/05/2003

Itinerário Previsto					
SAÍDA:			CHEGADA:		
DATA:	LOCAL:	HORÁRIO:	DATA:	LOCAL:	HORÁRIO:
01/05/2003	B	15:00	02/05/2003		15:00

Objetivo da Viagem:  
SDF  
Solicitado em: 08/04/2003

Coordenador do Subprojeto  
B. PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS  
Cidade: DF

Figura 33. Impressão da Solicitação de Viagem

ANA/GEF/PNUMA/OEA				
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO				
CONSULTORES				
LISTAGEM				
CPFE	NOME	SUBPROJETOS	SITUAÇÃO	
555.034.621-49 AÇÃO	ADRIANA BARROS	4.3	FALTA SUPPLIER	
827.114.531-20 AÇÃO	ALESSANDRA MARA FIRMINO		NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	
257.740.771-82 AÇÃO	ÁLVARO BANDUCCI JUNIOR	0.1 5.1 MS	FALTA SUPPLIER	
178.596.971-49 AÇÃO	AMÉRICO BATISTA		NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	
462.602.341-04 AÇÃO	ANA BEATRIZ BUCCO TALLARICO	0.1	NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.	
406.059.901-82 AÇÃO	ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA	3.2	FALTA SUPPLIER	
406.059.901-82 AÇÃO	ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA		NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	
524.284.860-04 AÇÃO	ANDRÉA DE OLIVEIRA GERMANO	5.3	FALTA SUPPLIER	
579.422.500-91 AÇÃO	ANTÔNIO AUGUSTO IORIS		NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	
053.027.901-06 AÇÃO	ANTÔNIO DA SILVA LISBOA	3.2	FALTA SUPPLIER	
777.888.508-53 AÇÃO	ANTÔNIO FÉLIX DOMINGUES		NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	
465.668.051-68 AÇÃO	AUREA DA SILVA GARCIA		FALTA SUPPLIER	
005.018.168-87 AÇÃO	BENEDITO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	9.4	NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	
156.713.301-06 AÇÃO	BRÍGIDO CRISTALDO		CADASTRO COMPLETO.	
			NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.	
			FALTA SUPPLIER	
			NÃO POSSUI CURRÍCULUM.	

Figura 34. Tela de controle de Consultores

ANA/GEF/PNUMA/OEA				
SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO				
EMPRESAS				
LISTAGEM				
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	SUBPROJETOS	SITUAÇÃO	
04.265.297/0001-78 AÇÃO	ANDRÉ PAULO CASTANHA - ME		NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.	
03.512.423/0001-89 AÇÃO	ARAKAKI E MARTINS LTDA		FALTA SUPPLIER	
03.330.644/0001-36 AÇÃO	ASE MOTORS LTDA		FALTA SUPPLIER	
37.465.457/0001-81 AÇÃO	ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA MELGASSENSE-AMEC	4.2	CADASTRO COMPLETO.	
03.910.539/0001-76 AÇÃO	CHECK PRINTER		FALTA SUPPLIER	
02.715.410/0001-44 AÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DOS RIOS MIRANDA E APA- CIDEMA	3.4 7.5	CADASTRO COMPLETO.	
02.104.328/0001-83 AÇÃO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO TAQUARI	1.2 1.7 5.2	FALTA SUPPLIER	
01.826.241/0001-57 AÇÃO	CONWEX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	6.1	CADASTRO COMPLETO.	
01.916.591/0001-04 AÇÃO	COOPERATIVA DE TRABALHOS MÚLTIPLOS EM SANEAMENTO BÁSICO LTDA- COPERSERV	1.6 MT 3.2 3.3 5.1 MT 7.4 MT 8.2 MT 8.3 MT	NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.	
33.120.577/0001-96 AÇÃO	ECOLOGIA E AÇÃO- ECOA	4.3 5.1 MS	CADASTRO COMPLETO.	
00.000.000/0008-88 AÇÃO	FEDERAL EXPRESS		NÃO HÁ INFORMAÇÃO BANCÁRIA.	
04.202.329/0001-96 AÇÃO	FUNDAÇÃO CÂNDIDO RONDON	9.1	FALTA SUPPLIER	
00.652.199/0001-32 AÇÃO	FUNDAÇÃO DA APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL - FUNDAPAM	1.1 1.7 3.1 A 3.1 B 5.2	CADASTRO COMPLETO.	

Figura 35. Tela de controle de Empresas

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SAIR

**PROJETOS** **PLANEJAMENTO - POA**

**COMPONENTES** **LISTAGEM**

SUBPROJETOS	SUBPROJETO	RUBRICA	ANO	RECURSOS
SOLICITAÇÕES	1.1 - FORMULAÇÃO DE MEIOS PARA PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA PESCA NO RIO TAQUARI (M5)	1201 - CONSULTORES	2003	5.820,00
CONSULTORES	AÇÃO			
EMPRESAS	1.1 - FORMULAÇÃO DE MEIOS PARA PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA PESCA NO RIO TAQUARI (M5)	1201 - CONSULTORES	2001	4.512,00
PREST. DE SERVIÇO	AÇÃO			
PLANEJAMENTO	1.1 - FORMULAÇÃO DE MEIOS PARA PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA PESCA NO RIO TAQUARI (M5)	1201 - CONSULTORES	2002	23.730,00
Listar	AÇÃO			
Incluir	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1101 - COORDENADOR TÉCNICO	2000	52.000,00
Alterar	AÇÃO			
Pesquisa Simples	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1101 - COORDENADOR TÉCNICO	2001	26.250,00
Pesquisa Avançada	AÇÃO			
Relatórios	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1101 - COORDENADOR TÉCNICO	2002	55.750,00
RUBRICAS	AÇÃO			
DOCUMENTAÇÃO	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1102 - ASSISTENTE COORDENAÇÃO TÉCNICA	2000	24.000,00
GERÊNCIA	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1102 - ASSISTENTE COORDENAÇÃO TÉCNICA	2001	23.000,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1102 - ASSISTENTE COORDENAÇÃO TÉCNICA	2002	30.000,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1103 - CLERK	2000	3.949,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1103 - CLERK	2001	6.000,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1103 - CLERK	2002	11.550,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1104 - APOIO TEC. ADM.	2000	48.192,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1104 - APOIO TEC. ADM.	2001	49.400,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1104 - APOIO TEC. ADM.	2002	49.400,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1105 - SEC. APOIO TEC. ADM.	2000	30.900,00
	AÇÃO			
	0.1 - COORDENAÇÃO TÉCNICA	1105 - SEC. APOIO TEC. ADM.	2001	31.200,00
	AÇÃO			

Figura 36. Tela do controle de Planejamento – Plano Operativo Anual

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SAIR

**PROJETOS** **RUBRICAS**

**COMPONENTES** **LISTAGEM**

SUBPROJETOS	CÓDIGO	RUBRICA	OBSERVAÇÕES
SOLICITAÇÕES	1101	COORDENADOR TÉCNICO	-
CONSULTORES	AÇÃO		
EMPRESAS	1102	ASSISTENTE COORDENAÇÃO TÉCNICA	-
PREST. DE SERVIÇO	AÇÃO		
PLANEJAMENTO	1103	CLERK	-
RUBRICAS	AÇÃO		
Listar	1104	APOIO TEC. ADM.	-
Incluir	AÇÃO		
Pesquisa Simples	1105	SEC. APOIO TEC. ADM.	-
Pesquisa Avançada	AÇÃO		
Relatórios	1201	CONSULTORES	-
DOCUMENTAÇÃO	AÇÃO		
GERÊNCIA	1301	OVERHEAD	-
	AÇÃO		
	1601	VIAGENS	-
	AÇÃO		
	2201	SUBCONTRATOS	-
	AÇÃO		
	3202	TREINAMENTOS	-
	AÇÃO		
	3302	WORKSHOP	-
	AÇÃO		
	4101	MATERIAL DE CONSUMO	-
	AÇÃO		
	4201	EQUIPAMENTOS	-
	AÇÃO		
	4201	MATERIAL PERMANENTE	-
	AÇÃO		
	5101	MANUTENÇÃO	-
	AÇÃO		
	5220	IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS	-
	AÇÃO		
	5301	CORREIOS	-
	AÇÃO		

Figura 37. Tela de controle de Rubricas

ANA/GEF/PNUMA/OEA

SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO

INÍCIO | RELATÓRIOS | AJUDA | SUPORTE

REPOSITÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARQUIVO	INCLUÍDO POR	DATA DE INCLUSÃO
006 AÇÃO	-	WORKSHOP_GEF.doc	ALTO PARAGUAI	09/04/2003 10:47
007 AÇÃO	GUIA OPERATIVO	Guia texto.doc	ALTO PARAGUAI	09/04/2003 12:56

PRJETOS  
 COMPONENTES  
 SUBPROJETOS  
 SOLICITAÇÕES  
 CONSULTORES  
 EMPRESAS  
 PREST. DE SERVIÇO  
 PLANEJAMENTO  
 RUBRICAS  
 DOCUMENTAÇÃO  
 Listar  
 Incluir  
 Pesquisa Simples  
 Pesquisa Avançada  
 Relatórios  
 GERÊNCIA

Figura 38. Tela do Repositório de Documentação do Projeto

#### **4. CONCLUSÕES**

O Sistema de informações gerenciais está em funcionamento desde 10 de abril de 2003. O acesso ao Sistema foi liberado no dia 20 de abril de 2003 para todos os usuários da Coordenação do Projeto GEF e da Direção Nacional. A partir do dia 29 de abril foi liberado o acesso ao Sistema para todos os coordenadores de Subprojetos.

O sistema foi desenvolvido em sintonia com assessoria administrativa/financeira dos dois projetos GEF, primeiros usuários do sistema. Desta forma, houve um acompanhamento *pari-passo* durante o desenvolvimento do sistema.

A maior parte das informações existentes em outras fontes de dados já está inserida no banco de dados do Sistema, sendo que o restante das informações dos Projetos GEF Pantanal/Alto Paraguai e GEF São Francisco encontram em processo de lançamento nos respectivos sistemas. A implantação dos Sistemas de Informações Gerenciais promoveu a melhoria dos procedimentos gerenciais dos Projetos, contribuindo para o acompanhamento, controle e eficiência de suas ações.

#### **5. RECOMENDAÇÕES**

O desenvolvimento de um sistema, como qualquer produto da inteligência humana, calca-se na transmissão de conhecimentos, idéias e regras de um cliente.

No desenvolvimento da atividade deste Subprojeto foram transcritas todas as regras do Projeto GEF, em todos os níveis de sua atividade, para um modelo sistêmico, culminando no desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais. O desenvolvimento desta atividade contou com recursos provindos de diversas fontes, entre as quais o próprio Projeto GEF, através de recursos financeiros e humanos, da Agência Nacional de Águas, através de recursos materiais e humanos, da Organização dos Estados Americanos, fornecendo o conhecimento e as regras necessárias para a criação do modelo. Nota-se que para o desenvolvimento das atividades deste Subprojeto, consolidadas no Sistema em conteúdo foram consumidos recursos preciosos de diversas fontes. Sendo assim, recomenda-se:

- Que a experiência acumulada, os produtos desenvolvidos, manuais de procedimentos, documentação técnica, e outros produtos deste Sistema sejam reutilizados em outras atividades do Projeto GEF, e mesmo em outros projetos que possuam estrutura semelhante, sob o comando da Organização dos Estados Americanos – OEA;
- As atividades executadas na concepção e desenvolvimento do Sistema sejam continuadas, visando melhor aproveitamento e melhoria do Sistema, uma vez que o mesmo pode ser utilizado em todos os Projetos GEF que possuam estrutura semelhante aos Projetos GEF Pantanal/Alto Paraguai e São Francisco;
- Adoção de procedimentos para manutenção continuada e evolutiva, visando, assim, constante aprimoramento do Sistema de Informações Gerenciais de cada Projeto.

## **6. BIBLIOGRAFIA**

Para o desenvolvimento do Sistema Informações Gerenciais foram utilizados os seguintes softwares:

- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Microsoft Internet Information Server
- Microsoft Visual Studio
- Microsoft SQL Server 2000

## **7. ATORES**

### **IKHON – Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda.**

SH/Norte – Quadra 2 – Bloco E – Loja 18 – Térreo – Kubitschek Plaza - CEP.: 70.702-904

Brasília/DF - Telefone Comercial: (61) 329-3651 e (61) 328-5690 – Fax: (61) 326-2275

e-mail: ikhon@ikhon.com.br
